



環境ハーモニー 人と大川の調和を育む
株式会社松本組

加保地区

府谷川 砂防えん堤工事

MAZMOTOだより

～Vol.4～

平成29年8月7日発行

はじめに

8月に入り、厳しい暑さが続いておりますので現場に従事している作業員及び職員はもちろんです、加保地区のみなさまにおかれましても、夏バテや熱中症には十分な対策をとって頂き暑い夏を乗り切って頂きたいと思っております。


当現場のお盆休みの日程は8月11日～8月16日までとなっております。現場出入口では立入禁止措置を取り、毎日見回りに職員が来ますが、なにかご不便な点や変わった点などございましたら下記の連絡先にお電話頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

工事の進捗状況

7月度は、本堰堤の構築が完了し副堰堤の構築を行っております。現在約20%が完了しました。本堰堤と同様に生コン車が頻繁に加保地区内を出入り致しますので、お子様の夏休みということもあり、人どおりが多くなっておりますので十分配慮し安全運行致しますので、ご協力の程よろしくお願い致します。副えん堤完成予定は8月中旬を目標に進めております。完成後はブロック積み擁壁工を行う予定としております。工事全体の進捗率としましては、7月末現在で73%となっております、予定工程通り進んでおります。工事完成まで無事故無災害で施工できるよう、全社協力一致し安全には十分な措置を取り進めて参りますので、最後までご協力賜りますようお願い申し上げます。

現場の進捗状況写真

完成イメージ図

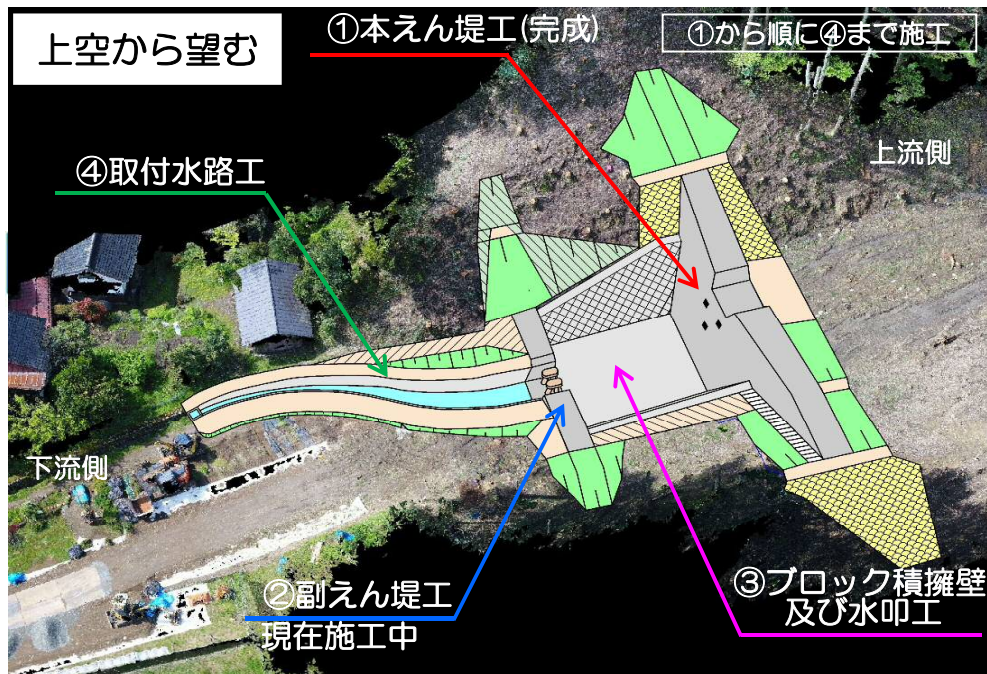

上記完成イメージ図の②副えん堤を構築しております。この副えん堤は本えん堤に土砂や流木がたまり水通し部から越流した際にくい止める働きがある構造物になります。8月19日完成予定です。



今後の工事につきましては、次に示す工程表に基づき進めてまいります。

①から順に進めて参ります

工種	年月	平成29年									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
仮設工		■	■								
①本えん堤工				■	■	■					
②副えん堤工						■	■				
③ブロック積み擁壁及び水叩工							■	■			
④取付水路工								■	■		
生コン車搬入台数		-	-	30	170	70	30	8	-		

※本表は予定であり、変更となる場合もあります。

今後も引き続き工事の進捗状況につきまして、ご報告してまいります。

なお、詳細は、右記までお問い合わせください。

■(株)松本組 府谷川砂防えん堤工事作業所

電話：079-660-2569へ

本新聞は毎月1回発行予定です。

★府谷川砂防えん堤工事だよりは、(株)松本組ホームページからも閲覧できます。 <http://mazmotogumi.co.jp/>
